

空港绿地新城六期项目进度（11月8日）

1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，宝瓶柱完成50%，玻璃安装完成45%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成，门厅入口铺装完成。



4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成45%，宝瓶柱完成50%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成，门厅入口铺装中。



8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成85%，宝瓶柱完成50%，玻璃安装完成40%，公区装修完成，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成，乔木完成。



14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内预交付维修。




17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，一体板完成93%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、涂料、窗台石、淋浴隔断、户内门、木地板安装完成，哑口套、入户门套、浴柜安装中。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，一体板完成92%，室内预交付维修。

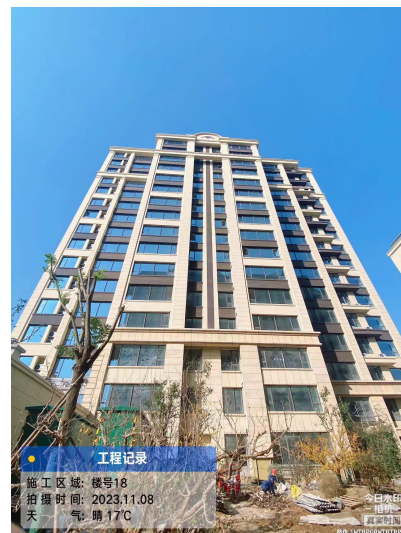

19 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，
一体板完成98%，室内预交付维修。



20 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，
一体板完成67%，室内预交付维修。



21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安
装完成98%，一体板完成35%，室内及公区
墙地砖完成，淋浴隔断完成，户内一遍
涂料完成50%，一层大堂贴砖及吊顶完成，
橱柜、户内门材料分料完成，木地板材
料到场。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成98%，二批次景观路硬化完成95%，石材铺装施工中，东入口台阶铺装完成、水景墙真石漆完成，西入口景观亭GRC装饰构件安装中，绿化苗木种植完成94%。



地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成98%，顶棚涂料完成，地坪完成98%，划线完成85%，机电桥架安装完成98%，热力完成98%，消防通风管安装完成97%，消防水安装完成97%。

